Dressing Casa Narcisa · Ghid de asamblare și debitare

Versiunea v15 · generat din modelul parametric (aceeași sursă ca HTML 3D, SketchUp și lista de debitare) · cote în mm · NU e pentru comandă fără verificarea punctelor marcate ?

Cum se citește: X = pe peretele A de la stânga (0 = peretele din stânga golului), Y = de la peretele A spre cameră (valori negative = în nișa B), Z = de la podea. Fiecare piesă din tabele are un număr; același număr apare în cercul albastru din desen. Lungime × lățime sunt dimensiunile de tăiat; direcția fibrei nu e specificată ?; canturile nu sunt specificate ?.

1. Dimensiuni generale

Gol	3090 lățime (perete A 1780 + nișa B 1310), tavan 2530, treaptă 491
Corpuri	3 × 1026 (jocuri stânga/dreapta 6), înălțime totală 2430 ; lateralele merg până în podea (z=0), fundul la z=80; plintă mică în față, sub uși
Adâncimi (carcasă, fără ușă și PFL)	530 (corpurile 1 și 2a), 1020 (2b și 3); PFL 3 peste carcasă; fața pe aceeași linie, ușile la 555 de peretele A
Material	PAL 18 pentru toate panourile și sertare; PFL 3 spate; uși 6 × 511 × 2346 (finisaj la alegere)
Cantități (modelul)	PAL 18: 60 piese, 30.11 m² · PFL: 4 piese, 7.23 m² · fronturi sertar PAL 18: 5 piese · uși: 6 piese, 7.19 m² · piese ascunse (traverse) din materialul de front: 6 piese, 0.29 m² (fără adaos de debitare și cant)

2. Feronerie

Articol	Buc	Observații
Balamale Blum CLIP top BLUMOTION 110°, ușă aplicată, cupă cu șuruburi 71B3550	36	6 pe ușă; șuruburi oală 3,5 × 15 / 17 (fișă Blum)
Plăcuțe de montaj în cruce, înălțare 0 mm, 173L6100	36	șuruburi lemn Ø3,5/4 × 17 (fișă)
Glisiere GTV PB-3D0SHX18-400-H (undermount, soft close, extragere totală) cu cârlige	5 perechi	NL 400, 30 kg/set
Lift haine Ambos LIFT 700 (75–115 cm, 15 kg)	1	corp 3
Bare Ø25: corp 2a (L 730), corp 3 spate (L 990)	2	material/model ?
Picior nivelator cu gheară Camar PNI.30000Z200A2 (max 100 kg, reglaj 20 mm)	?	pe interiorul lateralelor, sub fund; plus câte unul sub traversele corpurilor adânci (2b, 3) ?; număr (?, minim 4 pe corp, plus la panoul comun); șurub Ø4 în lateral (fișă furnizor)
Plintă interioară (PL1–PL4, PAL 18 × 80 înălțime), între laterale, la fața carcasei, sub fund	4	rămâne retrasă cu grosimea ușii față de uși; plinta de parchet se montează în față ?
Elemente de îmbinare carcase (confirmate 7 × 50 sau alt sistem)	?	sistemul nu a fost ales ?; poziții în „Îmbinări” mai jos
Glisiere cu bile H53 900 (pereche), 90 kg / pereche, pentru tava imprimantei (corp 3)	1 pereche	19,5 × 53,4–53,9 × 900 (fișă); găuri ?
Suport raft Ø5 (corp 1: 5 rafturi × 4; corp 2b: 2 rafturi mobile × 4) + 10% rezervă	28 + 4	diametrul bolțului ?

3. Ordinea generală de lucru


1. Taie toate piesele din lista de debitare (CSV) sau din tabelele de la fiecare corp.
2. Găurește balamalele și îmbinările înainte de asamblare (ghidurile din „Găurire și frezare” de la fiecare corp).
3. Asamblează fiecare corp pe plan: lateral – fund / plafon / raft fix – lateral, verifică diagonalele, apoi PFL.
4. Pune corpurile pe picioare, la nivel; fixează-le între ele prin laterale (4 puncte pe înălțime ?) și de perete.
5. Montează sertarele (corpul 2a), lift și bare (corp 3), apoi ușile.
6. La final: decupajul manual din plafonul/PFL-ul coloanei 2b pentru țeava de gaz (anexa 3).

4. De confirmat înainte de debitare / comandă ?


- Cotele 28,5 și 10 mm de la glisiera GTV (luate din desen, fără test); lățimea cutiei depășește NL (fișa o recomandă mai mică, risc acceptat).
- Număr balamale (6) pentru ușa de ~14 kg; picioarele și înălțimea lor; sistemul de îmbinare; profilul frezării pentru mâner (uși și sertare); canturi.
- Glisiere H53: găurile și jocurile (fișa nu a fost citită complet), 90 vs 100 kg, lățimea tăvii (joc 1,5 / parte), joc 15 mm deasupra imprimantei (dimensiunea exactă a ei).
- Cotele liftului (arc) sunt estimate din desen; țeava de gaz e orientativă (decupaj manual, distanțe de siguranță neverificate).

5. Privire de ansamblu

Fața (fără uși), cu cotele corpurilor

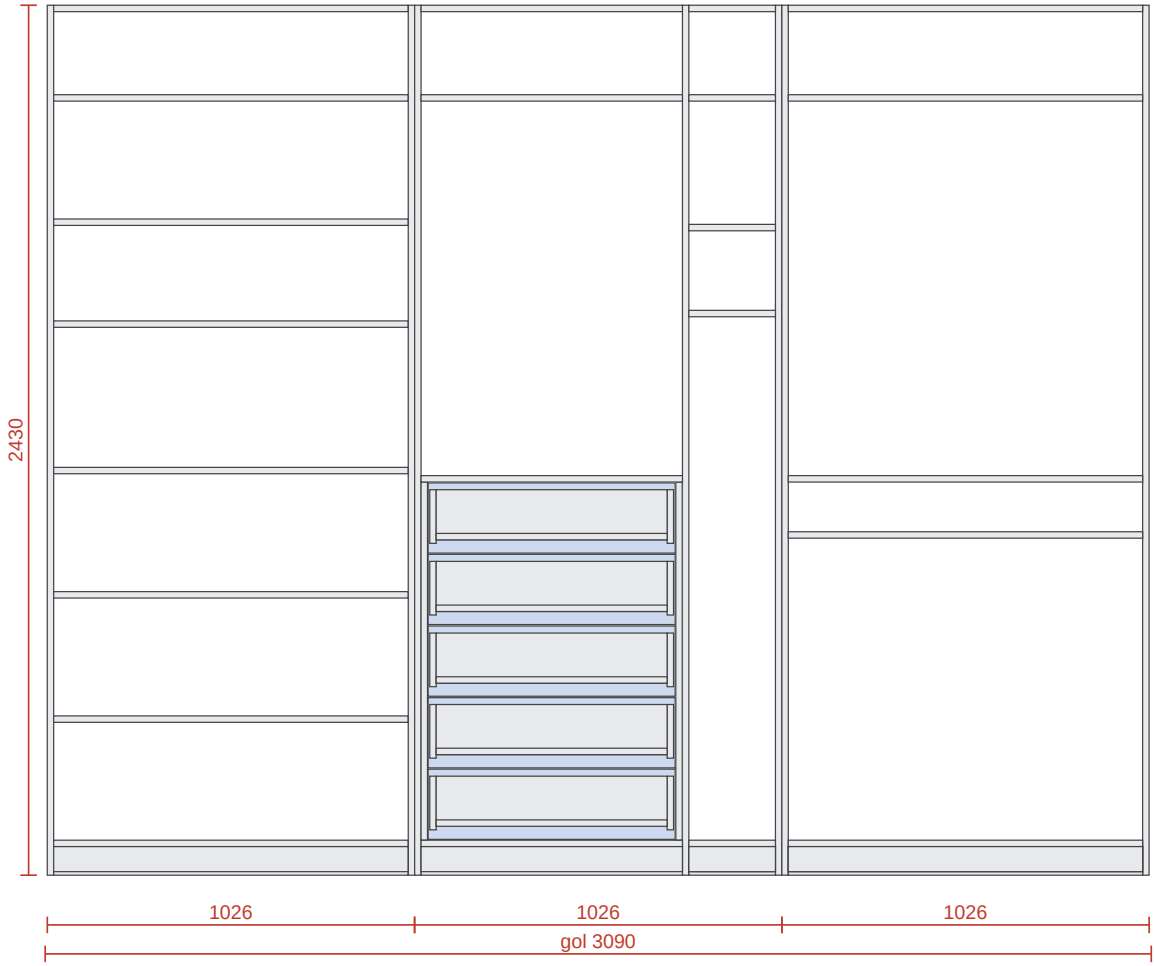


Plan (secțiune la z = 1100)

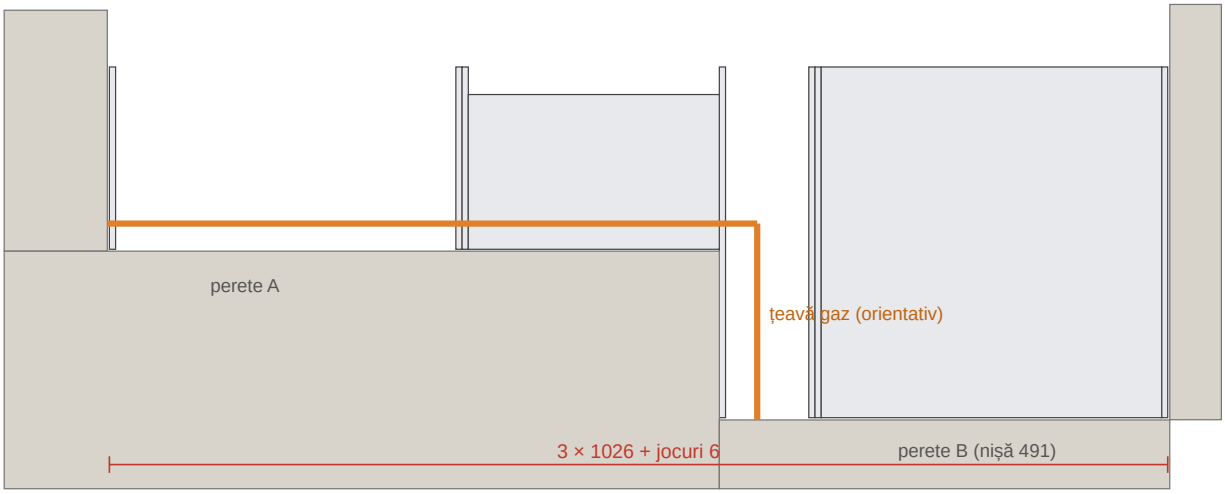

Corpul 1 și 2a sunt adânci de 530 (peste peretele A); 2b și 3 sunt în nișa B, adânci de 1020. Panoul comun dintre 2a și 2b (x 1780–1798) merge pe toată adâncimea și se sprijină pe fața treptei.

6. Corpul 1 (x 6–1032, adâncime 530) – vedere 3D și montaj

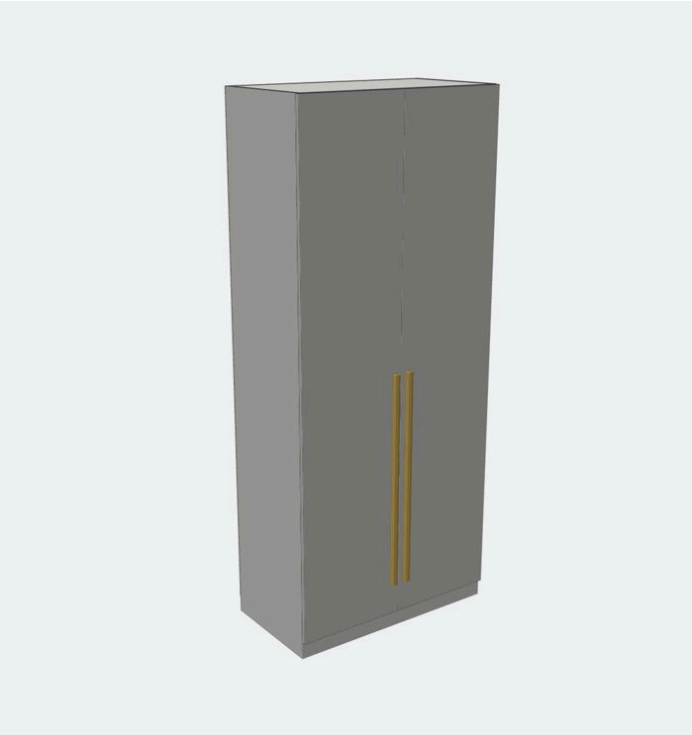

Cu uși




Fără uși (interior)


Pași de montaj

1. Pe o suprafață plană, așază lateralul stâng cu fața interioară în sus; găurește (dacă nu s-a făcut) plăcuțele balamalelor.
2. Fixează traversa (sub fundul de la z 80) între laterale, apoi fundul (z 80–98, laterale până în podea) și plafonul (z 2412–2430) între laterale, apoi raftul fix la z 2162–2180 (partea de sus la 250 de plafon).
3. Pune lateralul drept; strânge confirmatele pe rând, verifică ortogonalitatea (diagonalele egale).
4. Montează PFL-ul pe spate (peste carcasă; 2 mm de peretele A după dulap mutat 5 mm în față).
5. Montează picioarele nivelatoare pe interiorul lateralelor (sub fund), ridică corpul, aliniază cu corpul 2; fixează laterala dreaptă a corpului 1 de stânga corpului 2.
6. Introdu bolțurile și rafturile reglabile la cotele din tabel; montează plăcuțele și, la final, ușile (cupe cu șuruburi, reglaj ±2 mm lateral, ±3 mm înălțime).

6. Corpul 1 (x 6–1032, adâncime 530) – piese

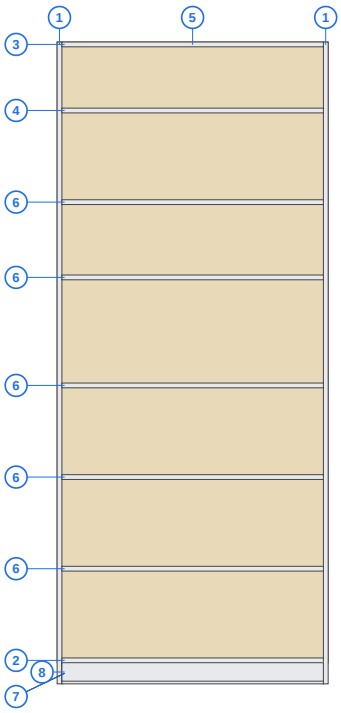

Față (fără uși), cercurile = numărul piesei din tabel.

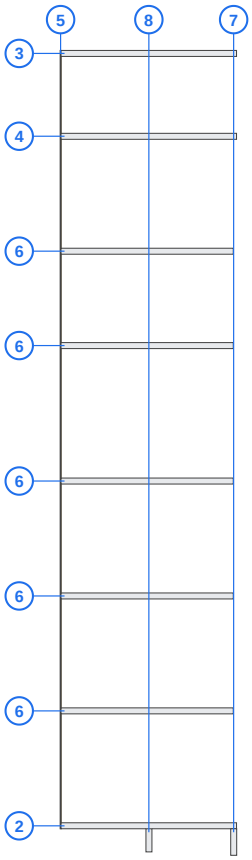


Secțiune laterală la x = 519.

Nr	Piesă	Buc	Lungime	Lățime	Gros.	Material	Observații
1	C1 lateral	2	2430	530	18	PAL 18	
2	C1 fund	1	990	530	18	PAL 18	
3	C1 plafon	1	990	530	18	PAL 18	
4	C1 raft fix sus	1	990	530	18	PAL 18	
5	C1 spate PFL	1	2350	1026	3	PFL 3	
6	C1 raft reglabil	5	990	520	18	PAL 18	
7	Plinta interioara C1	1	990	80	18	PAL 18	
8	C1 traversa sub fund 1	1	990	70	18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18	
9	Usa 1 stanga	1	2346	511	18	Front ușă (finisaj la alegere)	
10	Usa 1 dreapta	1	2346	511	18	Front ușă (finisaj la alegere)	

6. Corpul 1 (x 6–1032, adâncime 530) – găurire și frezare

Balamale – găuri pe lateralele 1 și 2 (stânga și dreapta, oglindit)



Lateral corp 1 (vedere din interior) · fața lateralului la dreapta · 530 × 2430

Balama	Centru de la baza lateralului	Gaura 1 (−16)	Gaura 2 (+16)	De la podea (centru)
1	202	186	218	202
2	623	607	639	623
3	1044	1028	1060	1044
4	1466	1450	1482	1466
5	1887	1871	1903	1887
6	2308	2292	2324	2308

Placuță 173L6100: două găuri pe verticală la 32 mm distanță, axa lor la **37 mm** de fața lateralului (fișă). Șuruburi lemn Ø3,5/4 × 17; diametrul găurii pilot ?. Aceleași înălțimi pe lateralul stâng și drept.

Uși – cupe Ø35 (ambele uși ale corpului)

Cupa la **23.5 mm** de muchia cu balamale (K = 6; ușa acoperă 17 din lateral), la înălțimile (de la baza ușii): **120, 541, 962, 1384, 1805, 2226**. Adâncimea găurii ? (fișa nu o dă); șuruburile cupei 3,5 × 15 / 17.

Traverse sub fund

Piesă	Dim.	Poziție
C1 traversa sub fund 1	990 × 70 × 18	y = 270 (centru), z 10–80

PAL 18 așezat pe cant, între laterale, în golul de 80 mm de sub fund; sprijină fundul la mijloc. Se fixează cu confirmate/șuruburi prin laterale și cu 2–3 șuruburi prin fund în cantul traversei ?. La corpurile adânci (1020) sunt două (la o treime și la două treimi din adâncime); un picior nivelator în plus sub traversă la corpul 3 (greutate mare).

Rafturi reglabile (corp 1)


Raft	Fața de jos, de la podea	De la fața de sus a fundului
1	427	409.0
2	774	756.0
3	1121	1103.0
4	1530	1512.0
5	1815	1797.0

Ocolesc zonele balamalelor (±35 mm ?). Bolțuri Ø5, câte 4 pe raft; le poți muta pe grila de 32 mm, ținând raftul la ≥35 mm de balamale.


Îmbinări carcasă (implicit: confirmate 7 × 50 ?)

Fund, plafon și raft fix între laterale: la ambele capete, găuri la distanța de la fața lateralului: **37, 265, 493** (adâncime 530; 37 de la față și de la spate). Ø5 în cantul panoului orizontal (centrat pe grosime, 9 mm de la fețe), Ø7 trecut prin lateral. Dacă alegi alt sistem (tamburi, dibluri) spune-mi și refac pozițiile.

Uși – cupe Ø35 (vedere dinspre interior)

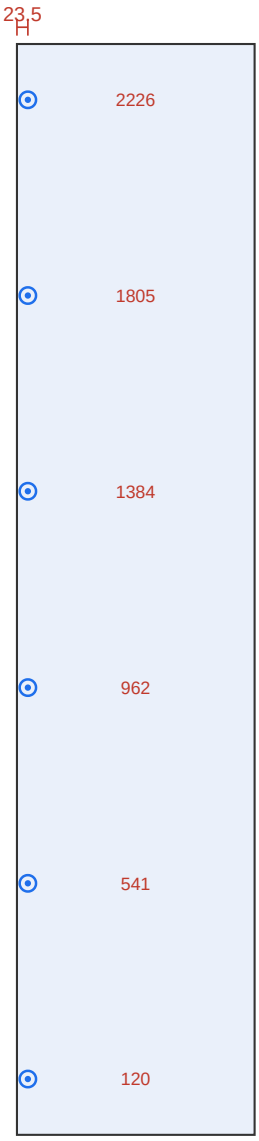


Ușă stânga 511 × 2346 · cotă de la baza ușii (roșu)

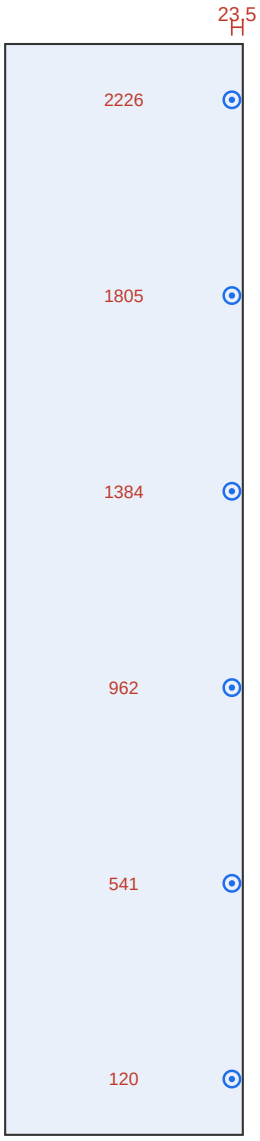

Ușă dreapta 511 × 2346 · cotă de la baza ușii (roșu)

Cupa: centru la 23.5 mm de muchia cu balamale, Ø35, adâncime ?. Ușa din stânga are balamalele pe muchia stângă, cea din dreapta pe muchia dreaptă.

7. Corpul 2 (2a + 2b, x 1032–2058) – vedere 3D și montaj

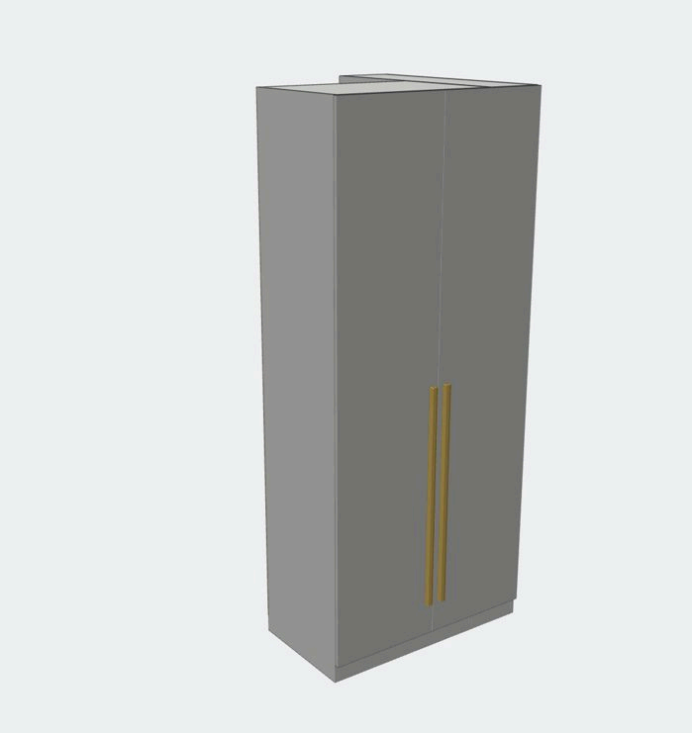

Cu uși




Fără uși (interior)


Pași de montaj

1. Panoul comun (x 1780–1798, 1020 adâncime) se sprijină pe fața treptei; montează-l primul pe latura 2a, între fundul și plafonul lui 2a.
2. Asamblează 2a: lateral stâng – traversă sub fund – fund – plafon – raft fix – panou comun; verifică diagonalele.
3. Asamblează 2b: panou comun – 2 traverse sub fund – fund – plafon – raft fix – lateral drept (1020 adâncime). Lasă PFL-ul lui 2b neîntins până faci decupajul pentru țeavă (anexa 3).
4. Subcorpul de sertare: laterale dublate (interior 694), capac la z 1098–1116; fixează-l la 80 mm de fața corpului (adâncime 450).
5. Fixează glisierele la cotele din tabel (10 / 210 / 410 / 610 / 810 de la fața fundului), cutiile cu frontul integrat, apoi verifică jocurile (2 mm sus/jos, 2 mm lateral, 4 mm între fronturi).
6. În 2b, pune bolțurile și cele 2 rafturi mobile la cotele din „Rafturi mobile 2b”.
7. Montează bara de cuier în 2a, apoi ușile: ușa dreaptă pe 2b, cea stângă pe 2a.

7. Corpul 2 (2a + 2b, x 1032–2058) – piese

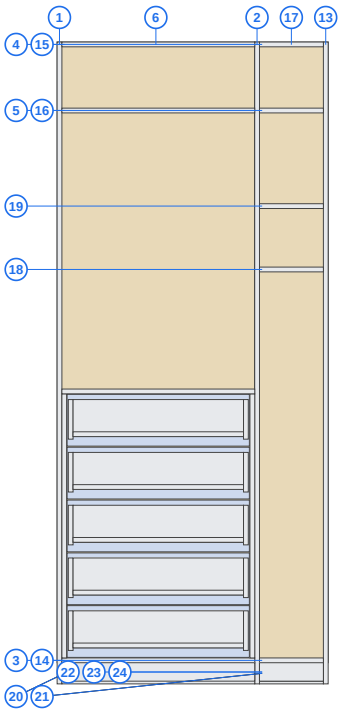

Față (fără uși), cercurile = numărul piesei din tabel.

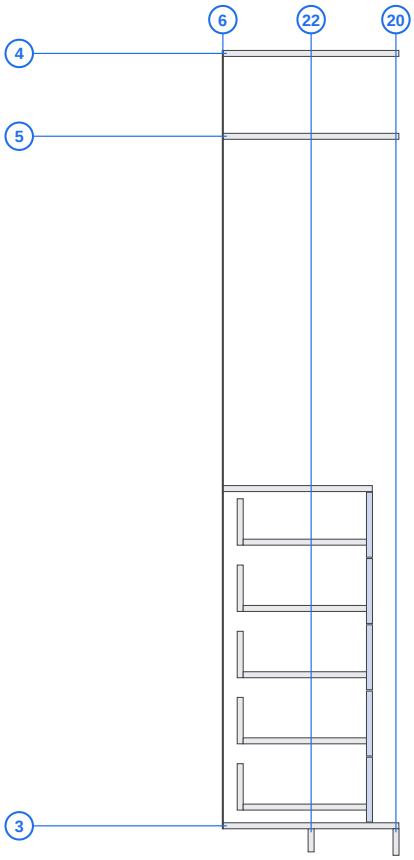


Secțiune laterală la x = 1400.

Nr	Piesă	Buc	Lungime	Lățime	Gros.	Material	Observații
1	C2a lateral	1	2430	530	18	PAL 18	
2	C2 panou comun 2a/2b (adancime completa)	1	2430	1020	18	PAL 18	
3	C2a fund	1	730	530	18	PAL 18	
4	C2a plafon	1	730	530	18	PAL 18	
5	C2a raft fix sus	1	730	530	18	PAL 18	
6	C2a spate PFL	1	2350	748	3	PFL 3	
7	Subcorp lateral	2	1000	450	18	PAL 18	
8	Subcorp capac (polita)	1	730	450	18	PAL 18	
9	Sertar front	5	690	196	18	PAL 18 frezat (front sertar)	
10	Sertar lateral	10	390	150	18	PAL 18	
11	Sertar spate	5	645	140	18	PAL 18	
12	Sertar fund	5	645	372	18	PAL 18	
13	C2b lateral	1	2430	1020	18	PAL 18	
14	C2b fund	1	1020	242	18	PAL 18	
15	C2b plafon	1	1020	242	18	PAL 18	
16	C2b raft fix sus	1	1020	242	18	PAL 18	
17	C2b spate PFL	1	2350	278	3	PFL 3	decupaj manual țeavă
18	C2b raft mobil 1	1	1010	242	18	PAL 18	
19	C2b raft mobil 2	1	1010	242	18	PAL 18	
20	Plinta interioara C2a	1	730	80	18	PAL 18	
21	Plinta interioara C2b	1	242	80	18	PAL 18	


22	C2a traversa sub fund 1	1	730	70	18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18	
23	C2b traversa sub fund 1	1	242	70	18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18	
24	C2b traversa sub fund 2	1	242	70	18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18	
25	Usa 2 stanga	1	2346	511	18	Front ușă (finisaj la alegere)	
26	Usa 2 dreapta	1	2346	511	18	Front ușă (finisaj la alegere)	

7. Corpul 2 (2a + 2b, x 1032–2058) – găurire și frezare

Balamale

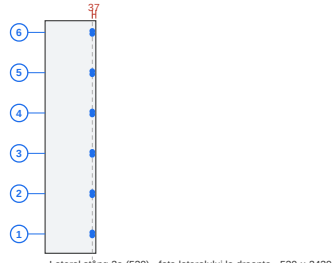

Lateral stâng 2a (530) · fața lateralului la dreapta · 530 × 2430

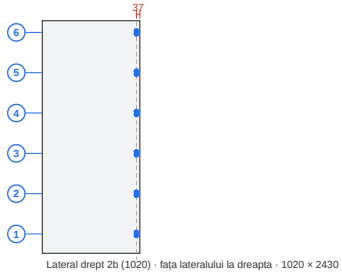

Lateral drept 2b (1020) · fața lateralului la dreapta · 1020 × 2430

Balama	Centru de la baza lateralului	Gaura 1 (−16)	Gaura 2 (+16)	De la podea (centru)
1	202	186	218	202
2	623	607	639	623
3	1044	1028	1060	1044
4	1466	1450	1482	1466
5	1887	1871	1903	1887
6	2308	2292	2324	2308

Ușa stângă se prinde de lateralul stâng al lui 2a, ușa dreaptă de lateralul drept al lui 2b; panoul comun (x 1780–1798) nu poartă balamale. Plăcuțe la 37 mm de la fața lateralului, 32 mm între găuri. Cupe Ø35 la 23.5 mm de muchie, înălțimi (de la baza ușii): 120, 541, 962, 1384, 1805, 2226.

Traverse sub fund

Piesă	Dim.	Poziție
C2a traversa sub fund 1	730 × 70 × 18	y = 270 (centru), z 10–80
C2b traversa sub fund 1	242 × 70 × 18	y = -145 (centru), z 10–80
C2b traversa sub fund 2	242 × 70 × 18	y = 195 (centru), z 10–80

PAL 18 așezat pe cant, între laterale, în golul de 80 mm de sub fund; sprijină fundul la mijloc. Se fixează cu confirmate/șuruburi prin laterale și cu 2–3 șuruburi prin fund în cantul traversei ?. La corpurile adânci (1020) sunt două (la o treime și la două treimi din adâncime); un picior nivelator în plus sub traversă la corpul 3 (greutate mare).

Rafturi mobile 2b (sus) – jos rămâne liber

Două rafturi PAL 18 × 1010 × 242, pe bolțuri Ø5 (4 per raft, grila de 32 mm ?), în partea de sus, cu fața de jos la z **1560** și **1800** (ambele între plăcuțele 4 și 5, fereastra 1501–1852), la 10 mm în spatele fetei; în afara ferestrelor un raft ar atinge o plăcuță (±35 mm ?). Jos rămâne liber de la fund (z 98) până la primul raft: 1462 mm, pentru aspirator, mătură etc. Bara de umerașe e doar în 2a (și bara fixă + liftul în corpul 3).

Subcorp sertare (laterale dublate) – găurire

- Laterale subcorp: 450 × 1000, x 1050–1068 și 1762–1780; interior LW = 694; adâncimea 450 (cu 80 mm în spate față de fața corpului, pentru balamale).
- Glisiere GTV: prima grupă de găuri la minim 37 mm de la fața subcorpului (fișă GTV); găurile se iau cu glisiera însăși ca șablon ? (pasul nu l-am putut citi sigur din desen).
- Marginea de jos a glisierei față de fața de sus a fundului (z 18.0): **10, 210, 410, 610, 810** mm pentru sertarele 1–5 (cota 28,5 și h_glisiera=10 din desen, fără test ?).


Cutii de sertar – găurire/frezare

- Cutie din 5 piese PAL 18: front 690 × 196 (integrat), 2 laterale 390 × 150, spate 645 × 140, fund 645 × 372.
- Lateralul coboară 10 mm sub fund; fundul stă între laterale, la nivelul marginii de jos a spatelui.
- Orificiu Ø6 × 10 (fișa GTV, cotele 11 și 2 din desen) pentru cârligul din spate; cârligele ofertei se montează cu șuruburi pe spatele frontului; poziția exactă se verifică pe fișa GTV pag. 2 ?.
- Profil de frezare pentru mâner (frontul): nedefinit ?. Rost la front 2 mm sus/jos/laterale, 4 mm între fronturi.

Îmbinări carcasă (implicit confirmate 7 × 50 ?)

Pentru 2a (adâncime 530): găuri la 37, 265, 493 de la față. Pentru 2b și panoul comun (adâncime 1020): 37, 273.5, 510, 746.5, 983. Panoul comun primește confirmatele fundului/plafonului/raftului de pe ambele fețe.

Glisiere GTV – găuri pe lateralele subcorpului (ambele laterale)

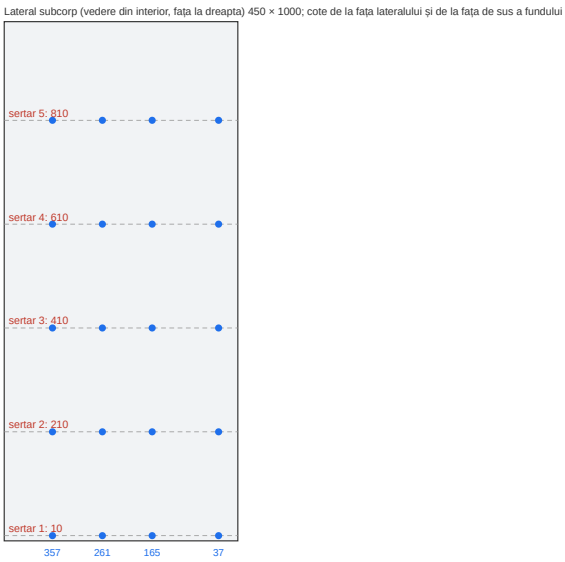


- Grupele de găuri (fișă GTV, NL 400): la **37 – 165 – 261 – 357 mm** de la fața lateralului (cote fișă 37 / 128 / 96 / 96); fiecare grupă = perechi la 32 mm ?.
- Înălțimea liniei glisierei de la fața de sus a fundului: **10, 210, 410, 610, 810** ?.
- Pentru precizie, folosește glisiera ca șablon (ține-o la cotă și marchează găurile).


Sertar GTV – piese și găuri

Piesă (per sertar)	Dim.	Găuri / frezări
Front (integrat)	690 × 196 × 18	cârlige/clipsuri pe spate, după fișa GTV; frezare mâner ?
Lateral (×2)	390 × 150 × 18	față de sus a laterală la 10 mm sub fund; găuri Ø6 (4 × 2, rânduri la 12 mm, pas 9 mm) pentru dispozitivul de blocare ?
Spate	645 × 140 × 18	orificiu Ø6 × 10 pentru cârligul din spate: cote 11 și 7 din fișă (direcția de confirmat pe fișă pag. 2) ?
Fund	645 × 372 × 18	—

Uși – cupe Ø35 (vedere dinspre interior)

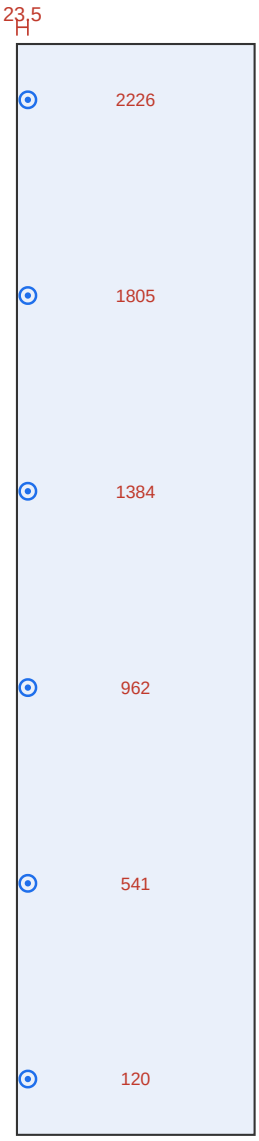


Ușă stânga 511 × 2346 · cotă de la baza ușii (roșu)

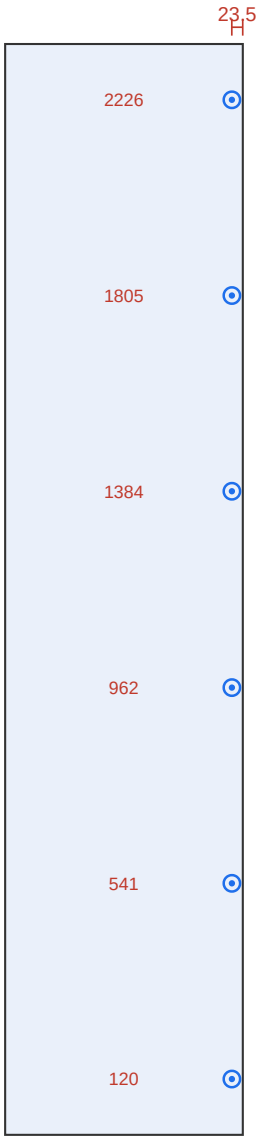

Ușă dreapta 511 × 2346 · cotă de la baza ușii (roșu)

Cupa: centru la 23.5 mm de muchia cu balamale, Ø35, adâncime ?. Ușa din stânga are balamalele pe muchia stângă, cea din dreapta pe muchia dreaptă.

8. Corpul 3 (x 2058–3084, adâncime 1020) – vedere 3D și montaj

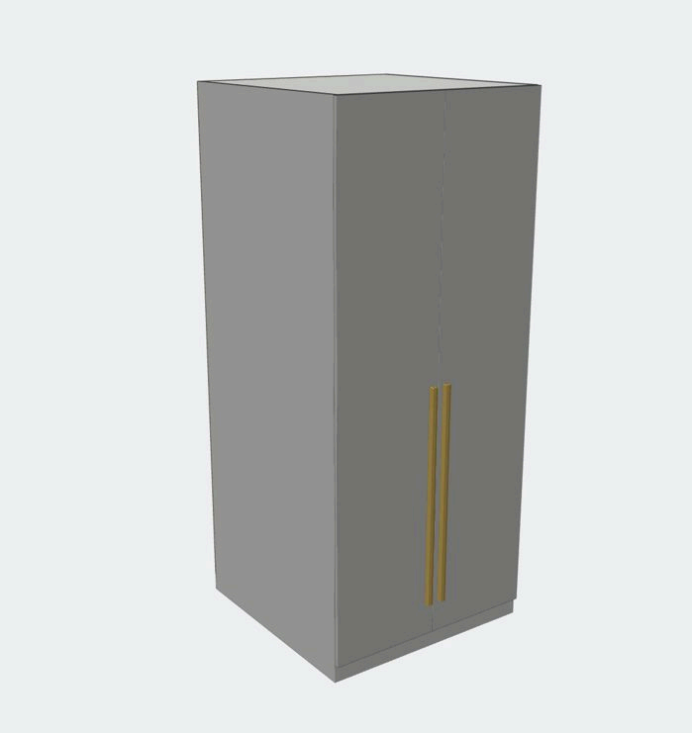

Cu uși




Fără uși (interior)


Pași de montaj

1. Asamblează lateral stâng – 2 traverse sub fund – fund – plafon – raft fix – raft despărțitor – raft fix imprimantă (z 941–959) – lateral drept; PFL pe spate (decupaj țeavă pe 2b, nu pe corpul 3).
2. Fixează glisierele H53 (pereche) pe laterale la z 108–162, față la 4 mm de fața carcasei; asamblează tava (laterale + față + spate + fund) și prinde-o pe partea mobilă; verifică jocul față de plăcuța primei balamale (z 202).
3. Montează carcasele liftului pe lateralele interioare la cotele din „găurire”, apoi bara; verifică jocul față de balamale.
4. Montează bara fixă din spate; apoi plăcuțele și ușile (două uși care se deschid la mijloc, rost 2 mm).
5. Testează lift: jos, bara iese ~220 mm în fața ușilor (ușile trebuie deschise complet).

8. Corpul 3 (x 2058–3084, adâncime 1020) – piese

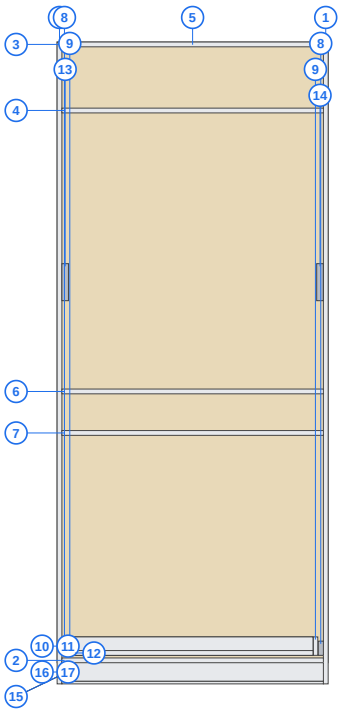

Față (fără uși), cercurile = numărul piesei din tabel.

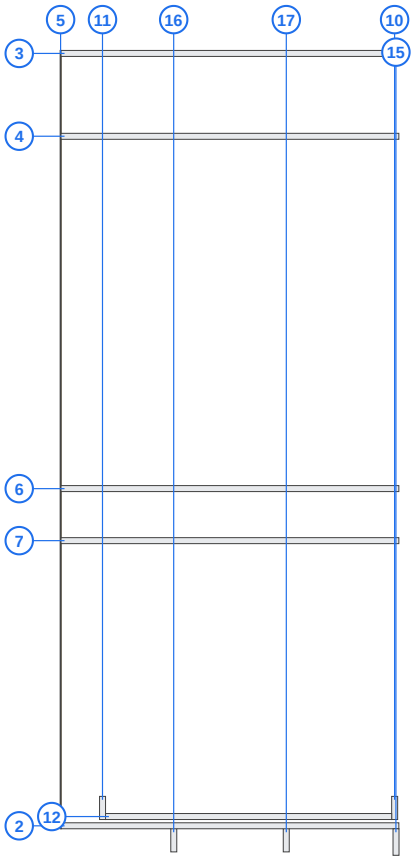


Secțiune laterală la x = 2570.

Nr	Piesă	Buc	Lungime	Lățime	Gros.	Material	Observații
1	C3 lateral	2	2430	1020	18	PAL 18	
2	C3 fund	1	1020	990	18	PAL 18	
3	C3 plafon	1	1020	990	18	PAL 18	
4	C3 raft fix sus	1	1020	990	18	PAL 18	
5	C3 spate PFL	1	2350	1026	3	PFL 3	
6	C3 raft despartitor (aliniat cu 2a)	1	1020	990	18	PAL 18	
7	C3 raft fix deasupra imprimantei	1	1020	990	18	PAL 18	
8	C3 glisiera H53 900 (pereche)	2	900	54	19.5	metal	
9	C3 tava lateral	2	900	70	18	PAL 18	
10	C3 tava fata	1	912	70	18	PAL 18	
11	C3 tava spate	1	912	70	18	PAL 18	
12	C3 tava fund	1	912	864	18	PAL 18	
13	C3 lift carcasa stanga	1	140	90	25	metal	
14	C3 lift carcasa dreapta	1	140	90	25	metal	
15	Plinta interioara C3	1	990	80	18	PAL 18	
16	C3 traversa sub fund 1	1	990	70	18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18	
17	C3 traversa sub fund 2	1	990	70	18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18	
18	Usa 3 stanga	1	2346	511	18	Front ușă (finisaj la alegere)	
19	Usa 3 dreapta	1	2346	511	18	Front ușă (finisaj la alegere)	

8. Corpul 3 (x 2058–3084, adâncime 1020) – găurire și frezare

Balamale (lateralele corpului 3, adâncime 1020)

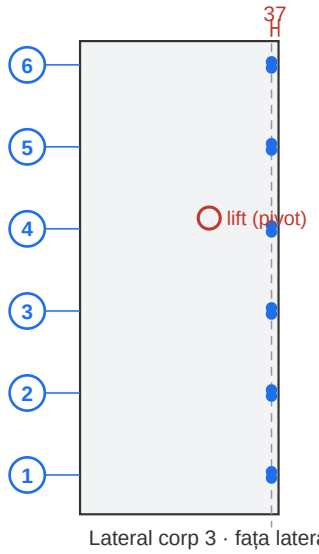

Lateral corp 3 · fața lateralului la dreapta · 1020 × 2430

Balama	Centru de la baza lateralului	Gaura 1 (−16)	Gaura 2 (+16)	De la podea (centru)
1	202	186	218	202
2	623	607	639	623
3	1044	1028	1060	1044
4	1466	1450	1482	1466
5	1887	1871	1903	1887
6	2308	2292	2324	2308


Plăcuțe la 37 mm de la fața lateralului, 32 mm între găuri; cupe Ø35 la 23.5 mm de muchie. Raftul despărțitor (z 1098–1116) e liber față de balamale (cea mai apropiată z=1044).

Traverse sub fund

Piesă	Dim.	Poziție
C3 traversa sub fund 1	990 × 70 × 18	y = -145 (centru), z 10–80
C3 traversa sub fund 2	990 × 70 × 18	y = 195 (centru), z 10–80

PAL 18 așezat pe cant, între laterale, în golul de 80 mm de sub fund; sprijină fundul la mijloc. Se fixează cu confirmate/șuruburi prin laterale și cu 2–3 șuruburi prin fund în cantul traversei ?. La corpurile adânci (1020) sunt două (la o treime și la două treimi din adâncime); un picior nivelator în plus sub traversă la corpul 3 (greutate mare).

Raft glisant pentru imprimantă (tavă tip cutie, corp 3)

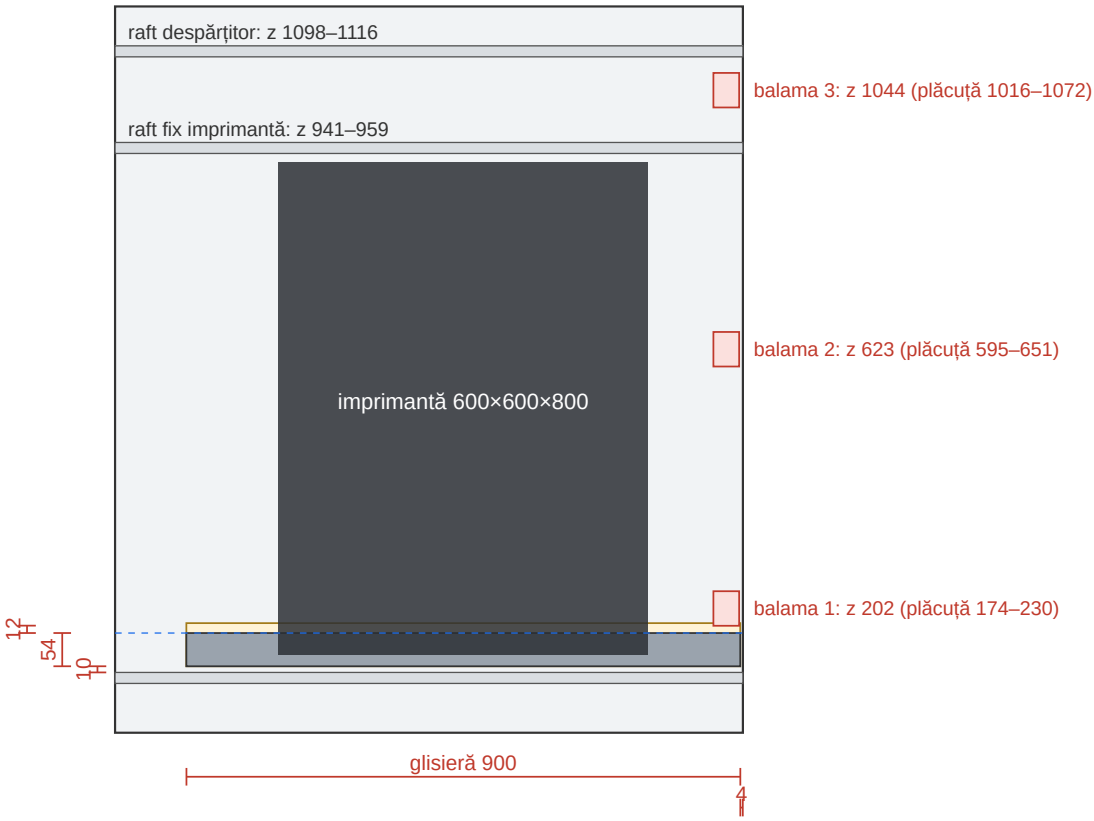

Piesă	Dim.	Observații
Laterale tavă (×2)	900 × 70 × 18	se prind pe partea mobilă a glisierei (șuruburi, la 108 de la podea, baza = baza glisierei)
Față și spate tavă (×2)	912 × 70 × 18	între laterale, rigidizează tava (nu se rotește / nu flexează)
Fund tavă	912 × 864 × 18	între laterale, față și spate, la z 108–126; imprimanta stă pe el
Glisiere cu bile H53, 900 (pereche)	19.5 lățime × 54 înălțime × 900	pe interiorul lateralelor, z 108–162 (10 mm deasupra fundului), de la 4 mm de fața carcasei până la 904; găurile: se iau cu glisiera ca șablon ? (fișa H53 nu e citită până la capăt)
Raft fix deasupra imprimantei	1020 × 990 × 18	z 941–959, între laterale, fixat cu confirmate la aceleași cote ca raftul despărțitor; joc 15 mm deasupra imprimantei (pentru 600×600×800) ?

- Lățimea tăvii (exterior) = 948 = interior corp − 2 × 19.5 (glisiere) − 2 × 1.5 joc ?; extragere ~800 ?.
- Prima balama (z 202) și glisiera: plăcuța de 56 mm ajunge la z 174, glisiera se termină la 162 → joc 12 mm; partea groasă a plăcuței (~20 mm) are și mai mult loc. Testează cu o balama și o glisieră reale pe o bucată de PAL înainte de debitare ?.
- Capacitate: H53 e dată pentru 90 kg per pereche (în text 100 kg ?); imprimanta ~40 kg + tavă ~15 kg.


Lift Ambos LIFT 700 (lățime 750–1150, 15 kg)

- Carcasele liftului pe lateralele interioare, pivot la y = 178 de la peretele A = **357 mm de la fața lateralului** (gaura a 10-a pe rândul de 32 mm, 37 + 32·k) ?; centru la z = 1521.12 (1521.12 de la baza lateralului) ?.
- Fișa spune că pe grila de 32 nu trebuie găuri suplimentare; cotele de arc (~700 jos, ~490 în față) sunt estimate din desen ?. Lățime utilă lift = interior 990 (în domeniul 750–1150).
- Bara fixă din spate: Ø25, L 990, la y = -235 de la peretele A, z = 2112; suporturi pe laterale ?.


Îmbinări carcasă (implicit confirmate 7 × 50 ?)

Adâncime 1020: găuri la 37, 273.5, 510, 746.5, 983 de la fața lateralului pentru fund, plafon, raft fix, raftul despărțitor și raftul de deasupra imprimantei (ambele capete). Raftul despărțitor la z 1098–1116 (aliniat cu capacul sertarelor din 2a). Jos: raftul fix de deasupra imprimantei și tava glisantă (vezi mai sus).

Uși – cupe Ø35 (vedere dinspre interior)

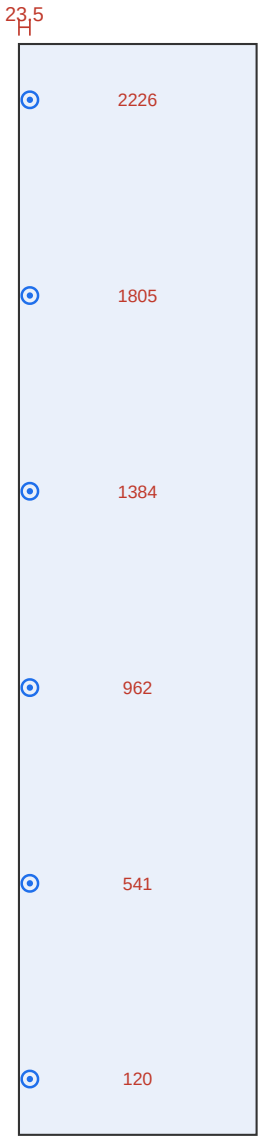

Ușă stânga 511 × 2346 · cotă de la baza ușii (roșu)

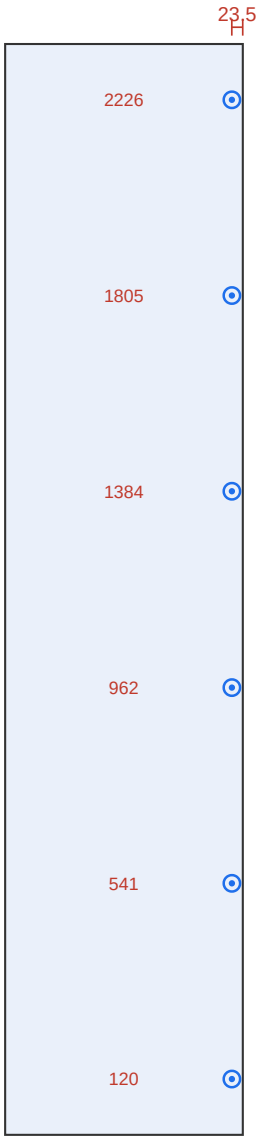

Ușă dreapta 511 × 2346 · cotă de la baza ușii (roșu)

Cupa: centru la 23.5 mm de muchia cu balamale, Ø35, adâncime ?. Ușa din stânga are balamalele pe muchia stângă, cea din dreapta pe muchia dreaptă.

9. Anexa 1 – ușă (găuri pentru cupe)

Toate cele 6 uși: 511 × 2346 × 18. Cupa Ø35 (71B3550, cu șuruburi) la **23.5 mm** de muchia cu balamale (K = 6, în intervalul 3–7 din fișă; acoperire 17); înălțimi de la baza ușii: **120, 541, 962, 1384, 1805, 2226**. Ușile din stânga ale fiecărui corp au balamalele pe muchia stângă, cele din dreapta pe muchia dreaptă. Adâncimea găurii și poziția șuruburilor de cupă: ? (nu sunt în fișa primită; se ia cu oala însăși ca șablon).

Ușă	x	z	Muchia balamalelor
Usa 1 stanga	7–518	82–2428	stânga
Usa 1 dreapta	520–1031	82–2428	dreapta
Usa 2 stanga	1033–1544	82–2428	stânga
Usa 2 dreapta	1546–2057	82–2428	dreapta
Usa 3 stanga	2059–2570	82–2428	stânga
Usa 3 dreapta	2572–3083	82–2428	dreapta

Rost minim 0,8 mm (grosime 18, K=6) + 0,4 dacă folosești reglajul lateral; rostul nostru între uși: 2 mm. Reglaje: înălțime ±3, lateral ±2, adâncime +3/−2 (fișă Blum).

10. Anexa 2 – sertar GTV (cutie)

Mărime	Valoare	Sursă
LW (interior subcorp)	694	model (730 − 2×18)
SKW = LW − 49 (interior cutie)	645	fișă GTV
Cutie exterior	681	= SKW + 2×18
SKL = NL − 10	390	fișă GTV
Adâncime min. subcorp	423 (avem 450)	NL + X + 5, X = 18 front
Grosime lateral cutie	16–19 (avem 18)	fișă GTV
Fronturi	690 × 196, la 2–198, 202–398, 402–598, 602–798, 802–998 față de fața fundului subcorpului	model
Distanța bază cutie – linia de jos a glisierei	28,5 (+ h_glisiera 10); lateral coboară 10	desen GTV, fără test ?
Extragere	NL − 16 ≈ 384	fișă (pierdere AV 16)

11. Anexa 3 – decupaj țeavă de gaz (manual, orientativ ?)

Zonele în care țeava (cu 25 mm joc) trece prin panourile coloanei 2b; coordonatele sunt în mm (x de la peretele din stânga, y de la peretele A, z de la podea). Țeava e orientativă; măsoară pe loc înainte de tăiere și păstrează accesibilă țeava.

Piesă	x	y	z
C2b plafon	1848–1932	-482–-398	2412–2430
C2b spate PFL	1848–1932	-488–-485	2228–2312

12. Piese de rezervă, șablon și feronerie în plus

Piesele de mai jos sunt în plus față de proiect: apar în lista de debitare și pe coli cu numele „REZERVĂ", în SketchUp într-un grup separat (în dreapta golului) și în HTML (bifa „piese de rezervă"). Nu intră în cantitățile corpurilor. Traversele, piesele ascunse ale sertarului de rezervă (fără front) și raftul de rezervă 2b se taie din materialul de front (culori uni, rămân pe colile de front); rafturile de rezervă pentru corpurile 1 și 3 din PAL.

Nr	Piesă	Dim.	Material
1	REZERVA sertar front	690 × 196 × 18	PAL 18 frezat (front sertar)
2	REZERVA sertar lateral stanga	390 × 150 × 18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18
3	REZERVA sertar lateral dreapta	390 × 150 × 18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18
4	REZERVA sertar spate	645 × 140 × 18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18
5	REZERVA sertar fund	645 × 372 × 18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18
6	REZERVA raft reglabil corp 1	990 × 520 × 18	PAL 18
7	REZERVA raft mobil 2b	1010 × 242 × 18	Din materialul de front (piesă ascunsă), 18
8	REZERVA raft corp 3 (990 x 1020)	1020 × 990 × 18	PAL 18

Șablon pentru găurirea cupelor (unealtă, se face o singură dată)

Bandă 100 × 2346 × 18 (PAL, scândură sau rest; nu intră în debitare, o faci din ce rămâne). Se sprijină pe muchia ușii (cu balamalele), cu o ghidare lipită de muchie. Găurile Ø35 se fac cu freza de cupe, centrul la **23.5 mm** de muchie, la înălțimile de la baza ușii: **120, 541, 962, 1384, 1805, 2226**. Aceleași 6 poziții pe toate cele 6 uși (desenul ușii: anexa 1); ușile din dreapta se găuresc pe muchia dreaptă (întoarce șablonul). Marchează „sus" și „jos" pe el. Adâncimea găurii ? se ia de pe cupa Blum însăși.

Feronerie în plus (nu intră în debitare)

- 2 balamale Blum CLIP top BLUMOTION 110° și 2 plăcuțe 173L6100 (în plus față de 36).
- 10% bolțuri de raft Ø5, șuruburi cupă/plăcuță și confirmate/îmbinări (sistem ?).
- 1 picior nivelator în plus (Camar PNI.30000Z200A2) și 4 șuruburi pentru prinderea glisierelor H53 ?.
